




Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

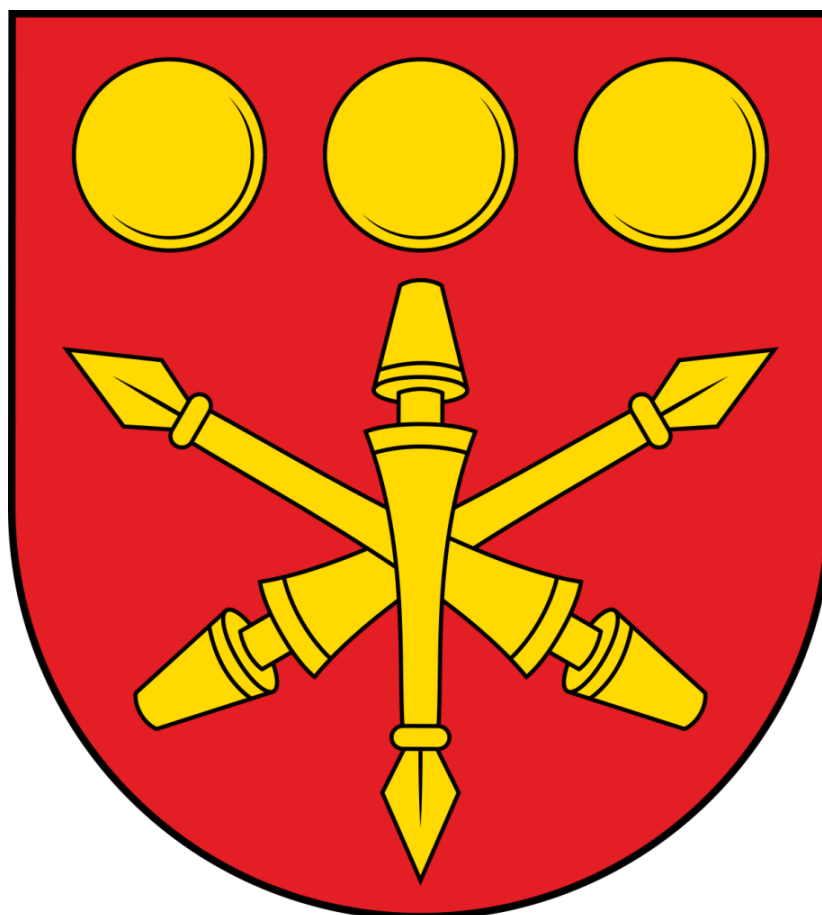

## **Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Sułów na lata 2026 - 2028**



# Spis treści

Wstęp .....	3
Podstawa prawna .....	3
Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności .....	4
Osoby ze szczególnymi potrzebami .....	4
Analiza stanu zastanego .....	5
Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności .....	6
Działania w obszarze dostępności architektonicznej .....	6
Działania w obszarze dostępności cyfrowej .....	6
Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej .....	7
W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej nie podjęto działań .....	7
Działania w obszarze pozostałych działaniach .....	7
Cel i działania .....	7
1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej .....	7
2. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej .....	8
Harmonogram realizacji .....	9
Dostępność architektoniczna .....	9
Dostępność informacyjno-komunikacyjna .....	26
Szacowany koszt realizacji planu .....	29
Monitoring realizacji .....	29
Wykres .....	30



## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,
- dostępność cyfrowa,
- dostępność informacyjno- komunikacyjna,
- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
- współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- szkolenia pracowników;
- informowania o działaniach na rzecz dostępności;
- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1440),



- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023 poz. 20).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

## Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

1. Zarządzenie Nr 199/O/2025 Wójta Gminy Sułów z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Sułów.
2. Zarządzenie Nr 7/U/2026 Wójta Gminy Sułów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Sułów.

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami" to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,
- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
- rodzice z wózkami dziecięcymi,
- niewidome i słabowidzące,
- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
- z zaburzeniami psychicznymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- cudzoziemcy,
- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
- nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.



## Analiza stanu zastanego

Urząd Gminy Sułów mieści się w jednym budynku, który znajduje się pod adresem Sułów 63. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu frontowym znajdują się 2 schodki, przy schodach nie ma poręczy. Drugie wejście umiejscowione jest z tyłu budynku, zapewnia dostęp do budynku bezpośrednio z poziomu terenu. Przy budynku Urzędu Gminy wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma urządzeń służących do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Przy głównym wejściu znajduje się tablica z numeracją pomieszczeń, brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń udostępnionej w sposób dotykowy lub głosowy. Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w języku Braille'a. Podmiot nie posiada urządzeń do obsługi osób niedosłyszących lub słabosłyszących. Gmina Sułów jest administratorem 2 stron internetowych: <https://sulow.pl/> oraz <https://bip.sulow.pl/>, strony są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Gmina Sułów nie posiada aplikacji mobilnych. Gmina Sułów wykonuje swoje zadania za pomocą jednostek organizacyjnych, w tym trzech Szkół Podstawowych.

### 1. Szkoła Podstawowa im. Róży Zamoyskiej w Sułowie

Do budynku szkoły prowadzi wejście główne, do którego wiodą trzystopniowe schody z poręczą, oraz dwa inne wejścia: pierwsze - od strony boiska - ze schodami z poręczą oraz drugie – boczne - bez schodów.

Na parkingu znajdującym się przed budynkiem szkolnym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Budynek szkoły nie posiada windy, wejście na I piętro możliwe jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma zainstalowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych urządzeń technicznych umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W budynku nie ma urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

### 2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia, główne wejście wiedzie szerokimi schodami, posiada drzwi spełniające normy szerokości, drugie wejście - od strony boiska prowadzi przez wąskie schody i drzwi niespełniające wymogów szerokości.

W budynku nie ma windy, przemieszczanie się między piętrami możliwe jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma urządzeń służących do ewakuacji osób



z niepełnosprawnościami ani urządzeń wspomagania słuchu. Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Przy budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie wszystkie drzwi w budynku spełniają normy szerokości.

3. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji Kitowa w Tworyczowie  
Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne oraz 2 wejścia boczne, każde z wejść posiada schody. W budynku szkoły nie ma windy, przemieszczanie się między piętrami możliwe jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma urządzeń służących do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ani urządzeń wspomagania słuchu. Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Przy budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

### Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- Dostosowanie toalety w budynku Urzędu Gminy Sułów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

### Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny.  
W kwietniu 2024 roku został przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Sułów <https://sulow.pl/> oraz strony BIP Urzędu Gminy



Sułów <https://bip.sulow.pl/> przez firmę Radosław Szymaszek Centrum  
Bezpieczeństwa Informatycznego.

## Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej nie podjęto działań.

## Działania w obszarze pozostałych działaniach

- Powołanie koordynatora ds. dostępności.
- Przyjęcie "Standardów Dostępności w Samorządzie".
- Wprowadzenie Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Sułów.

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

## Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- 1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej prac związanych z poprawą dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.
- 1.2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas prac związanych z poprawą dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.
- 1.3. Poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.
- 1.4. Przygotowanie terenu wraz z wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.



- 1.5. Przystosowanie toalety szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie dla osób z niepełnosprawnościami wraz z kompleksowym remontem sanitariatu i montażem systemu przywoławczego.
- 1.6. Wykonanie pochylni do budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.
- 1.7. Zakup i montaż krzeselka krzywoliniowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.
- 1.8. Aktualizacja procedury ewakuacji z uzupełnieniem o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
- 1.9. Zakup i montaż 4 tabliczek z piktogramem pętli indukcyjnej.
- 1.10. Zakup i montaż systemu przyzywowego w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Sułów.
- 1.11. Zakup i montaż tablicy przedstawiającej plan ewakuacji obowiązujący w budynku Urzędu Gminy Sułów.
- 1.12. Zakup tabliczek z oznaczeniem pomieszczeń w alfabecie Braille'a do budynku Urzędu Gminy Sułów.
- 1.13. Zakup tabliczki informacyjnej w języku Braille'a informującej o godzinach pracy Urzędu Gminy Sułów.
- 1.14. Zakup udźwiękowionego planu tyflograficznego przedstawiającego rozkład pomieszczeń dostępnych dla interesantów w budynku Urzędu Gminy Sułów.
- 1.15. Zakup 4 sztuk krzeseł ewakuacyjnych wraz ze szkoleniem z obsługi zakupionych urządzeń.
- 1.16. Zakup 3 defibrylatorów wraz ze szkoleniem z obsługi zakupionych urządzeń.

## **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**

- 2.1. Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego.
- 2.2. Zakup 4 sztuk pętli indukcyjnych wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Opracowanie dokumentacji projektowej prac związanych z poprawą dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: przygotowanie terenu wraz z wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie pochylni do budynku, przystosowanie toalety szkolnej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z kompleksowym remontem sanitariatu, montaż krzesetka krzywoliniowego, poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie.

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-07-01

#### Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowej	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
1. 3	Opracowanie dokumentacji projektowej prac związanych z poprawą dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	Wykonawca	6	7000

## 2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas prac związanych z poprawą dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II

Celem zadania jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas następujących prac: przygotowanie terenu wraz z wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie pochylni do budynku, przystosowanie toalety szkolnej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z kompleksowym remontem sanitariatu, montaż krzeselka krzywoliniowego, poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-07-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
2. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
2. 3	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas prac związanych z poprawą dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II	Wykonawca	16	7000

### **3. Poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie**

Celem działania jest dostosowanie otworów drzwiowych do wymaganych wymiarów określonych przez ustawę Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Otwory drzwiowe przeznaczone do poszerzenia obecnie nie spełniają wymagania minimalnej szerokości, co stanowi barierę architektoniczną. Dzięki poszerzeniu otworów i wymianie stolarki drzwiowej pomieszczenia staną się dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-07-01



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3.1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na wykonanie prac	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
3.2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
3.3	Poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	Wykonawca	8	25000

## 4. Przygotowanie terenu wraz z wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

Celem działania jest umożliwienie osobom o ograniczonej mobilności wygodnego opuszczenia pojazdu oraz bezpiecznego i sprawnego dotarcia do budynku.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-07-01

## Zadania



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na wykonanie prac	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
4. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
4. 3	Przygotowanie terenu wraz z wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością	Wykonawca	8	10000

## **5. Przystosowanie toalety szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnościami wraz z kompleksowym remontem sanitariatu i montażem systemu przywoławczego**

Dostosowanie szkolnej toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwi stworzenie dostępnej przestrzeni bez barier i znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Montaż w toalecie systemu przywoławczego zwiększy poczucie bezpieczeństwa i umożliwi sprawne wezwanie pomocy.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-07-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na wykonanie prac	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
5. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
5. 3	Przystosowanie toalety szkolnej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z kompleksowym remontem sanitariatu	Wykonawca	8	30000
5. 4	Montaż systemu przywoławczego w toalecie dla osób z niepełnosprawnością	Wykonawca	1	2000

## 6. Wykonanie pochylni do budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

Wykonanie pochylni do budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie umożliwi samodzielne i bezpieczne wejście do budynku osobom poruszającym się na wózkach, eliminując istniejące bariery architektoniczne. Zapewni komfort psychiczny i fizyczny osobom z ograniczeniami w poruszaniu się jednocześnie zwiększając ich niezależność.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-07-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
6. 1	Przygotowanie i ogłoszenia zapytania na wykonanie prac	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
6. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	8	0
6. 3	Wykonanie pochylni do budynku szkoły	Wykonawca	10	15000

## 7. Zakup i montaż krzeselka krzywoliniowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

Działanie ma na celu likwidację bariery architektonicznej i umożliwienie osobom z niepełnosprawnością ruchową bezpieczne i samodzielne przemieszczanie się między kondygnacjami budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zwiększy niezależność użytkowników z ograniczoną sprawnością ruchową.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-07-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
7. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na dostawę i montaż krzeselka krzywoliniowego	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
7. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
7. 3	Dostawa i montaż krzeselka krzywoliniowego	Wykonawca	8	100000

## 8. Aktualizacja procedury ewakuacji z uzupełnieniem o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

Celem działania jest aktualizacja procedury ewakuacji obowiązującej w Budynku Urzędu Gminy Sułów o elementy dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób niepełnosprawnych z w sytuacji zagrożenia.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-09-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
8. 1	Przegląd bieżącej procedury obowiązującej w budynku Urzędu Gminy Sułów	Pracownik ds BHP	1	0
8. 2	Uzupełnienie procedury o elementy dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami	Pracownik ds BHP	4	0
8. 3	Zatwierdzenie procedury i przekazanie pracownikom informacji na temat zmian wprowadzonych w procedurze	Pracownik ds BHP	1	0

## 9. Zakup i montaż 4 tabliczek z piktogramem pętli indukcyjnej

Tabliczki z piktogramem pętli indukcyjnej zostaną umieszczone w budynkach, do których zostaną zakupione pętle indukcyjne, a więc w budynkach: Urzędu Gminy w Sułowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Tworyczowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Sułowie (1 szt.) oraz Szkoły Podstawowej w Michalowie (1 szt.). Piktogramy zostaną zamontowane w miejscach lokalizacji pętli indukcyjnych, ułatwi to osobom ze szczególnymi potrzebami odnalezienie miejsc w których mogą skorzystać z urządzeń.

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-09-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
9. 1	Zakup tabliczek z piktogramem pętli indukcyjnej	Referat Rozwoju Gospodarczego	2	1000
9. 2	Montaż tabliczek z piktogramem pętli indukcyjnej	Administrator budynku	1	0

## 10. Zakup i montaż systemu przyzywowego w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy Sułów

Montaż systemu przywoławczego w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami zwiększy poczucie bezpieczeństwa i umożliwi sprawne wezwanie pomocy.

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-09-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
10.1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup	Referat Rozwoju Gospodarczego	2	0
10.2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
10.3	Dostawa i montaż systemu przyzywowego	Wykonawca	4	2000

### **11. Zakup i montaż tablicy przedstawiającej plan ewakuacji obowiązujący w budynku Urzędu Gminy Sułów**

Zakup tablicy przedstawiającej w sposób graficzny aktualny plan ewakuacji zwiększy bezpieczeństwo użytkowników budynku w sytuacji zagrożenia oraz zmniejszy ryzyko chaosu, co ułatwi opuszczenie strefy zagrożenia.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-09-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
11. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
11. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	4	0
11. 3	Dostawa i montaż tablicy	Wykonawca	2	2500

## 12. Zakup tabliczek z oznaczeniem pomieszczeń w alfabecie Braille'a do budynku Urzędu Gminy Sułów

Celem działania jest zapewnienie swobodnej orientacji osobom niewidomym lub słabowidzącym w przestrzeni publicznej. Umieszczenie tabliczek z oznaczeniem pomieszczeń obok drzwi pozwoli na identyfikację pomieszczeń przez osoby niewidome lub słabowidzące.

**Priorytet:** Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

**Data początkowa:** 2026-09-01

**Zadania**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
12. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
12. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
12. 3	Dostawa tabliczek z oznaczeniami w alfabecie Braille'a	Wykonawca	4	5000

### 13. Zakup tabliczki informacyjnej w języku Braille'a informującej o godzinach pracy Urzędu Gminy Sułów

Działanie ma na celu zapewnienie możliwości samodzielnego odczytania przez osoby niewidome lub słabowidzące informacji o czasie pracy Urzędu Gminy Sułów.

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-09-01

#### Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
-----	-------	--------------------------	---------------------	----------------------



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
13. 1	Zakup i montaż tabliczki	Referat Rozwoju Gospodarczego	2	500

#### **14. Zakup udźwiękowionego planu tyflograficznego przedstawiającego rozkład pomieszczeń dostępnych dla interesantów w budynku Urzędu Gminy Sułów**

Celem działania jest zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sułów w sposób wizualny, dotykowy i głosowy. Dzięki podjętym działaniom osoby z problemami ze wzrokiem lub słuchem będą mogły poznać rozkład pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Sułów oraz z łatwością zlokalizować poszukiwane pomieszczenie.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-09-01

##### **Zadania**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
14. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup	Referat Rozwoju	1	0



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
		Gospodarczego		
14.2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
14.3	Dostawa i montaż udźwiękowionego planu tyflograficznego przedstawiającego rozkład pomieszczeń dostępnych dla interesantów w budynku Urzędu Gminy Sułów	Wykonawca	6	25000



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 15. Zakup 4 sztuk krzeseł ewakuacyjnych wraz ze szkoleniem z obsługi zakupionych urządzeń

Krzeseła ewakuacyjne zostaną zakupione do budynków: Urzędu Gminy w Sułowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Tworyczowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Sułowie (1 szt.) oraz Szkoły Podstawowej w Michalowie (1 szt.). Celem działania jest zapewnienie szybkiej oraz bezpiecznej ewakuacji osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie. Krzeseła ewakuacyjne sprawdzą się w nagłym przypadku konieczności pokonywania schodów lub nierównych powierzchni przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-10-01

### Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
15. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup sprzętu	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
15. 2	Wybór i podpisanie umowy z dostawcą sprzętu	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
15. 3	Dostawa sprzętu	Wykonawca	4	25000
15. 4	Szkolenie pracowników z obsługi sprzętu	Wykonawca	1	0



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 16. Zakup 3 defibrylatorów wraz ze szkoleniem z obsługi zakupionych urządzeń

Defibrylatory zostaną zakupione do budynków: Szkoły Podstawowej w Tworyczowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Sułowie (1 szt.) oraz Szkoły Podstawowej w Michalowie (1 szt.). Celem działania jest możliwość zapewnienia natychmiastowej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia u uczniów, nauczycieli i innych osób odwiedzających szkołę. Pracownicy szkół zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi defibrylatorów.

**Priorytet:** Niski - podnoszące jakość dostępności

**Data początkowa:** 2026-10-01

### Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
16. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
16. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
16. 3	Dostawa defibrylatorów	Wykonawca	4	21000
16. 4	Szkolenie z obsługi defibrylatorów	Wykonawca	1	0



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Dostępność informacyjno-komunikacyjna

### 1. Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego

Działanie wynika z: art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz.1411) oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2023 poz. 20). Celem działania jest zapewnienie w Urzędzie Gminy Sułów pełnej dostępności do usług publicznych poprzez możliwość swobodnego porozumiewania się dla osób komunikujących się w PJM.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-07-01

#### Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego tłumaczenie	Referat Rozwoju Gospodarczego	4	0
1. 2	Podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym	Referat Rozwoju Gospodarczego	4	8000



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 3	Umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM on-line na stronie internetowej podmiotu	komórka IT/redaktor_ka strony www	1	0

## 2. Zakup 4 sztuk pętli indukcyjnych wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

Pętle indukcyjne zostaną zakupione do budynków: Urzędu Gminy w Sułowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Tworyczowie (1 szt.), Szkoły Podstawowej w Sułowie (1 szt.) oraz Szkoły Podstawowej w Michalowie (1 szt.) Zakup pętli indukcyjnych w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu osób słabosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Zastosowanie pętli indukcyjnych w budynkach szkolnych pozwoli na ulepszenie jakości komunikacji w trudnych warunkach akustycznych, będą one służyć potencjalnym uczniom oraz rodzicom uczniów z problemami ze słuchem. Zakup pętli indukcyjnej do budynku Urzędu Gminy pozwoli na podniesienie komfortu podczas załatwiania spraw urzędowych przez interesantów niedosłyszących i słabosłyszących.

**Priorytet:** Wysoki - wynikający wprost z przepisów

**Data początkowa:** 2026-10-01

### Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
-----	-------	--------------------------	---------------------	----------------------



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup pętli	Referat Rozwoju Gospodarczego	1	0
2. 2	Wybór i podpisanie umowy z wykonawcą	Referat Rozwoju Gospodarczego	6	0
2. 3	Dostawa i montaż pętli	Wykonawca	4	14000
2. 4	Szkolenie pracowników z obsługi pętli	Wykonawca	1	0



## Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostępność architektoniczna: **278 000 zł**
2. Dostępność cyfrowa: **0 zł**
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: **22 000 zł**
4. Pozostałe działania: **0 zł**

Suma szacowanych kosztów: **300 000 zł**

## Monitoring realizacji

Koordinator do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotowuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.

Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów.

Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Koordynator ds. dostępności - Katarzyna Abramek

Osoba zatwierdzająca plan: Wójt Gminy Sułów - Piotr Kaliszewski



## Wykres

Data początkowa	Nr	Działania i zadania	Data końcowa
2026-07-01		<b>Dostępność architektoniczna</b>	2026-12-23
2026-07-01	1	1.1 1.2 1.3	2026-09-30
2026-07-01	2	2.1 2.2 2.3	2026-12-08
2026-07-01	3	3.1 3.2 3.3	2026-10-14
2026-07-01	4	4.1 4.2 4.3	2026-10-14
2026-07-01	5	5.1 5.2 5.3 5.4	2026-10-21
2026-07-01	6	6.1 6.2 6.3	2026-11-10
2026-07-01	7	7.1 7.2 7.3	2026-10-14
2026-09-01	8	8.1 8.2 8.3	2026-10-13
2026-09-01	9	9.1 9.2	2026-09-22
2026-09-01	10	10.1 10.2 10.3	2026-11-23
2026-09-01	11	11.1 11.2 11.3	2026-10-20
2026-09-01	12	12.1 12.2 12.3	2026-11-16
2026-09-01	13	13.1	2026-09-15
2026-09-01	14	14.1 14.2 14.3	2026-11-30
2026-10-01	15	15.1 15.2 15.3 15.4	2026-12-23
2026-10-01	16	16.1 16.2 16.3 16.4	2026-12-23
		<b>Dostępność cyfrowa</b>	
		Brak działań	
2026-07-01		<b>Dostępność informacyjno-komunikacyjna</b>	2026-12-23
2026-07-01	1	1.1 1.2 1.3	2026-09-02
2026-10-01	2	2.1 2.2 2.3 2.4	2026-12-23
		<b>Pozostałe działania</b>	
		Brak działań	

Wykres harmonogramu realizacji projektu 1
